

เรื่อง แจ้งการปรับและสงวนสิทธิตามสัญญา

๑. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

การที่แผนกพระธรรมมูญ ฯ จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ นั้นจะต้องดำเนินการตาม ขั้นตอน ที่ได้วางแผนการทำงานไว้

๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน


๒.๑ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานบริษัท ทุกส่วน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

๒.๒ เพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนมีความต่อเนื่อง และ ถูกต้อง


๓. กระบวนการ การทำงาน

ซึ่งขั้นตอนการทำงานมีขั้นตอนดังนี้

แผนผังการทำงาน

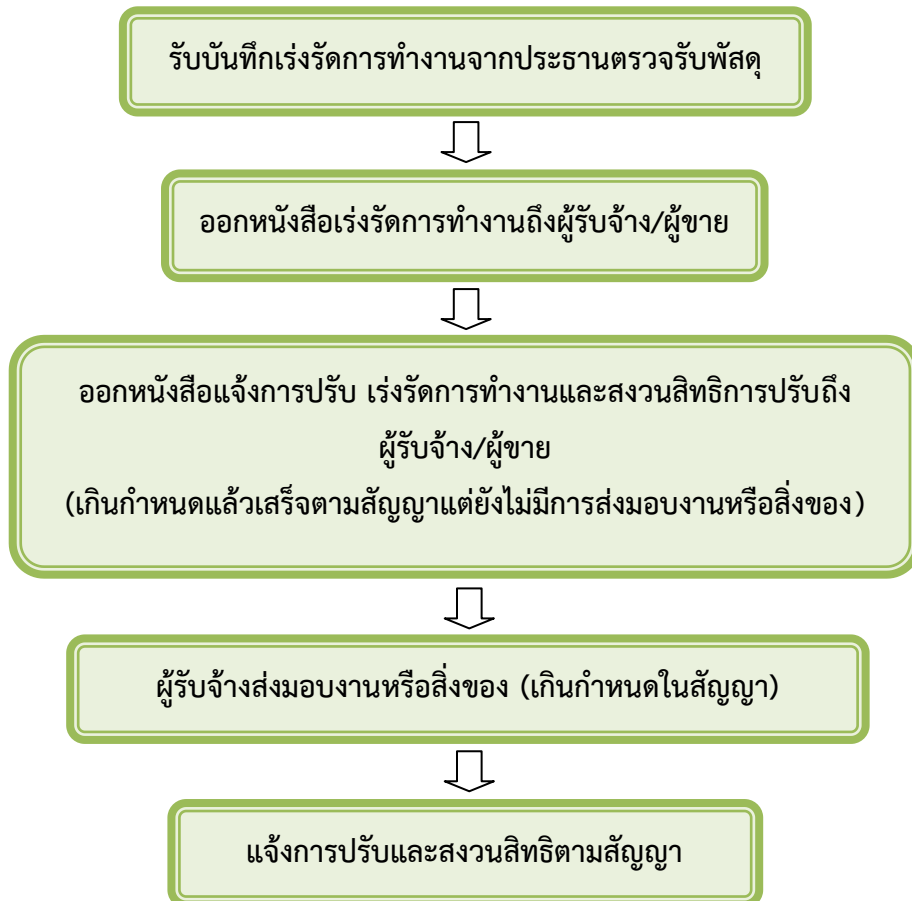

๓.๑ รับบันทึกเร่งรัดการทำงานจากประธานตรวจรับพัสดุ

 **บันทึกข้อความ** คคจ.11

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ

ที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างงานตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ _____

เสนอ ชย.ทร.

๑. ตามที่ ชย.ทร. แต่งตั้งให้กระผม _____ เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
จ้าง _____ ตามสัญญา ชย.ทร. ____/งป. ____
ลง _____ โดยมี บริษัท _____
เป็นผู้รับจ้างในวงเงิน _____ บาท ซึ่งมีกำหนดเริ่มงาน _____ กำหนดแล้วเสร็จ _____ ระยะเวลา
ดำเนินงาน _____ วัน แบ่งงานเป็น _____ งวดนั้น

๒. ปัจจุบัน _____ เวลาได้ผ่านมาแล้ว _____ วัน คิดเป็น _____ เปอร์เซ็นต์ คงเหลือเวลา _____ วัน
ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ _____ งวด จากจำนวน _____ งวด คิดเป็นร้อยละ _____ คณะกรรมการเห็นว่า
เข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากรณี

- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการภายใน ๓๐ วัน หลังจากเริ่มงานตามสัญญา
- ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะเวลาเกิน ๓๐ วัน ขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุความจำเป็นให้ทราบ
- เมื่อครบระยะเวลา ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกเงินได้
น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของค่าจ้างทั้งหมด
- เมื่อครบระยะเวลา ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้
น้อยกว่า ๑ ใน ๒ ของค่าจ้างทั้งหมด
- ใกล้เคียงที่สุดกำหนดเวลาในสัญญาแล้ว งานอาจไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
- สิ้นสุดกำหนดเวลาในสัญญาแล้ว งานยังไม่แล้วเสร็จ

๓. เห็นควร

- มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง _____ มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับให้ผู้รับจ้างทราบ

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓.๓ ออกหนังสือแจ้งการปรับ เร่งรัดการทำงานและสงวนสิทธิการปรับถึงผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
(เกินกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาแต่ยังไม่มี การส่งมอบงานหรือสิ่งของ)

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ กท ๐๕๒๖.๔/ _____

กรมช่างโยธาทหารเรือ
ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการปรับ เร่งรัดการทำงาน และขอสงวนสิทธิตามสัญญา,

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท _____

อ้างถึง สัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____

ตามอ้างถึง กองทัพเรือ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ตกลงจ้าง บริษัท _____

ก่อสร้าง _____

วงเงิน _____ บาท (_____)

กำหนดเริ่มงานวันที่ _____ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ _____ แบ่งงวดงานเป็น _____

งวด ค่าปรับกรณีทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดวันละ _____ บาท (_____)

ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น,

กองทัพเรือ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ ขอเรียนว่าขณะนี้ครบกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว
ทั้งนี้ ยังไม่สามารถส่งมอบงานครบตามกำหนดให้แก่ทางราชการได้ กองทัพเรือ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
จึงขอใช้สิทธิปรับทั้งๆ เป็นรายวัน ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ ทั้งๆ ทำงาน
แล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งขอสงวนสิทธิอื่น ๆ ที่ทางราชการมีอยู่ตามสัญญา
ที่อ้างถึงทุกประการโดยในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบ (๑๐%) ของวงเงินค่าจ้าง
ทางราชการจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับทั้งๆ แต่อาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควร
หากทั้งๆ มีหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบงาน และยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นให้ทางราชการทราบ
ทั้งนี้ขอให้ทั้งๆ เร่งรัดการทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย,

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ขอแสดงความนับถือ,

พลเรือตรี

(_____)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

แผนกพระธรรมนูญ,

โทร. ๐ ๒๕๖๖ ๐๓๘๘

๓.๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน (เกินกำหนดในสัญญา)

รายงานผลการตรวจการจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมทำ

เลขที่ใบแจ้งหนี้ ๑๑๑
วันที่ 4 ก.ค. 2562
เวลา ๑๕.๕๐

๙ ก.ค. 2019 หน่วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการตรวจการจ้าง เหมาก่อสร้าง

เขียน จก.ชบ.พร.

อ้างถึง คำสั่ง วันที่ ๓ ก.ค.๒๕๖๒ (เลขที่ ๑๑๑) ที่ ต่อ กทสท. ๖ เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๒ ลง ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๒

กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ ๕๓๐๘
วันที่ ๕ ก.ค. 2562
เวลา ๑๐.๑๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือส่งมอบงาน บริษัท _____

ตามคำสั่งที่อ้างถึง คณะกรรมการได้ตรวจงาน _____

ตามที่ผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ _____ ขอเรียนให้ทราบดังนี้

กองการพัสดุ ชบ.พร.
เลขที่ ๑๒๐๖
วันที่ ๕ ก.ค. 2562
เวลา ๑๕.๐๐

๑. สัญญาจ้าง _____ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____

ราคาจ้างเหมา _____ บาท มีรายการดำเนินการตามสัญญา คือ-

๑.๑ วัสดุเชื้อเพลิงสวน สวนหลวง ที่แผน _____

๑.๒ _____

๒. ผู้รับจ้าง _____

๓. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ถูกต้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา

๔. งานนี้ได้แบ่งเป็น งวด งวดนี้เป็นงวดที่ _____ (วัสดุเชื้อเพลิง) _____ ตามเงื่อนไขของสัญญา

แล้วเสร็จใน _____ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ _____

๕. เกิน/ไม่เกิน กำหนดในสัญญา จำนวน _____ (๒๑/๒๑) วัน

๖. คณะกรรมการ ได้รับ / ไว้ในรายการ ค่าจ้างเงินงวดที่ _____ (วัสดุเชื้อเพลิง) _____ จำนวน _____ บาท

ให้แก่ผู้รับจ้างได้

๗. เหตุผลที่ไม่รับไว้ใช้ราชการ _____

๘. ข้อคิดเห็นในผลงานของผู้รับจ้าง _____

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ควรมีความเห็นต่อจะกรุณา

๑. น.ท. _____ ประธานา ()

๒. น.ท. _____ กรรมการ ()

๓. น.ท. _____ กรรมการ ()

กรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. ในข้อ ๓, ๔ และ ๖ ให้ตัดชำระความที่ไม่ถูกต้องออก และลดขนาดค่าปรับไว้ด้วย

๒. ในข้อ ๘ ให้ตัดชำระคืนเงินของกรรมการตรวจรับพัสดุ เกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติของ

ผู้รับเหมาที่ผลงานดี / ต่ำ การควมดีอาจเปรียบต่อทางราชการ ซื่อสัตย์ ๆ


ที่เห็นว่าการตรวจรับพัสดุ คร. ทนาย

พ.จอมบำรุง
๕/๗๐/๒๕
๒๕๖๒

กมลวิ
๒.๗.๖๒
๕๗๑

๓.๕ แจ้งการปรับและสงวนสิทธิตามสัญญา

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๕๒๖.๔/_____

กรมช่างโยธาทหารเรือ
ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งการปรับ และสงวนสิทธิตามสัญญา
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท _____
อ้างถึง สัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____
ตามอ้างถึง กองทัพเรือ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ตกลงจ้าง บริษัท _____
ก่อสร้าง _____
_____ ว่างเงิน _____ บาท (_____
_____) กำหนดเริ่มงานวันที่ _____ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ _____
_____ กำหนดการจ่ายเงินเป็น _____ งวด กำหนดค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า
เป็นรายวัน ๆ ละ _____ บาท (_____) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ทางราชการเมื่อวันที่ _____
_____ เลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นจำนวน _____ วัน กองทัพเรือ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ จึงขอ
สงวนสิทธิการปรับและขอใช้สิทธิปรับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้นพร้อมทั้งสงวนสิทธิอื่น ๆ
ที่มีอยู่ตามสัญญาที่อ้างถึงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี
(_____)
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

แผนกพระธรรมนูญ
โทร.๐ ๒๕๖๖ ๐๓๘๘

_____ ๖/๖/๒๕๖๒
_____ ที่ _____
_____ ๖/๖/๒๕๖๒

๔. ผลการดำเนินการ

ทำให้รู้ว่าแต่ละบริษัทมีการทำงานและส่งมอบงานหรือส่งมอบของล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา
